




## Totale finanziamento UNIONE EUROPEA

STANZIATO: 924.478.481 Euro

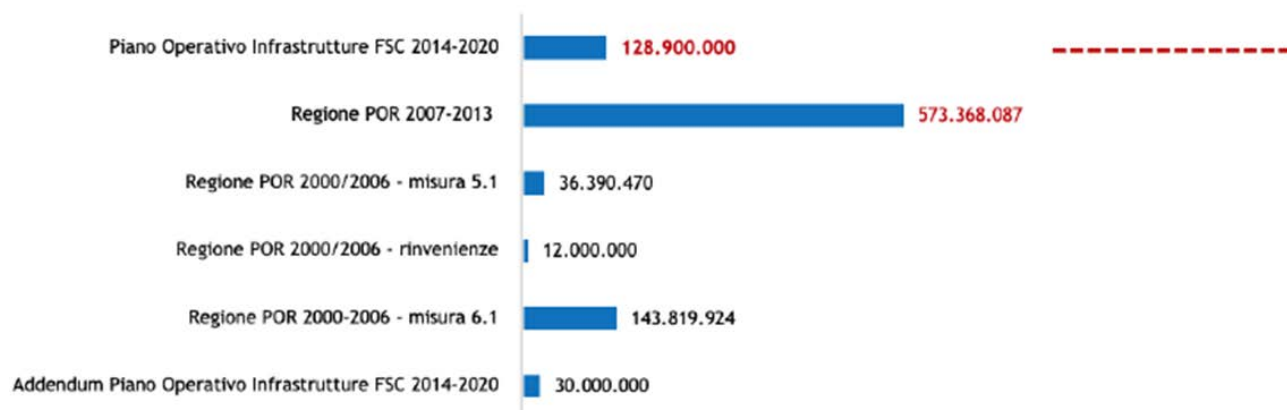

Fonte: Dati forniti dal [COMUNE DI NAPOLI](#)

# EUROPA - ricostruzione dei finanziamenti

Dettaglio finanziamenti FSC 2014-2020 - 128,9 million Euro e Regione POR 2007-2013

TITOLO	METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - GARIBALDI - CDN	GRANDE PROGETTO. COMPLETAMENTO LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI
DESCRIZIONE	Completamento delle stazioni Duomo, Municipio e Garibaldi della tratta DANTE - GARIBALDI - CDN.	Completamento delle opere civili e realizzazione delle opere tecnologiche della tratta Dante (esclusa)-Municipio (inclusa)-Garibaldi (inclusa)- Centro Direzionale
NATURA	Nuova realizzazione	Nuova realizzazione
CICLO DI PROGRAMMAZIONE	2014-2020	2007-2013
FONTE	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo alla programmazione 2014/2020	Fondi Strutturali relativi alla programmazione 2007/2013
FONDO		Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
PROGRAMMA	PIANO FSC INFRASTRUTTURE	POR CONV FESR CAMPANIA
ASSE	2. Trasporto sostenibile urbano	4. Accessibilità e trasporti
OBIETTIVO		6. Sistema della metropolitana regionale
PROGRAMMATORE	MIT-DG TPL5	Regione Campania
ATTUATORE		Comune Napoli
BENEFICIARIO	Comune Napoli Direzione Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità	Comune Napoli
UNIONE EUROPEA		429.845.948,89 €
FONDO DI ROTAZIONE		79.446.993,91 €
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	128.900.000,00 €	63.834.989,05 €
COMPLETAMENTI		98.240.154,15 €
REGIONE		
COMUNE		260.144.498,49 €
ALTRA FONTE PUBBLICA		542.487.415,51 €
TOTALE	128.900.000,00 €	1.474.000.000,00 €
TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	12.890.000,00 €	573.127.931,85 €
INIZIO PREVISTO	02/01/91	01/01/00
INIZIO EFFETTIVO		01/01/00
FINE PREVISTA	31/01/21	31/12/16
FINE EFFETTIVA	ND	ND
FASE CORRENTE	Esecuzione lavori	Esecuzione lavori

Fonte: Dati [Open Coesione](#) (Marzo, 2021)
